Rødovre Kommune
I/S Vestbad
Samlet tidsplan

Oplæg til Tids- og aktivitetsplan
Rådgiverudbud, forslagsfasen og udførelse i totalentreprise

9.1.15 /JL

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato
1			
2	**Godkendelse af proces- og projektbeskrivelse**	**21 dage**	**ti 10-02-15**
3	**KFU, Rødovre Kommune**	0 dage	ti 10-02-15
4	**ØU, Rødovre Kommune**	0 dage	on 18-02-15
5	**KB, Rødovre Kommune**	0 dage	ti 24-02-15
6	**KU, Brøndby Kommune**	0 dage	on 18-02-15
7	**ØU, Brøndby Kommune**	0 dage	on 04-03-15
8	**KB, Brøndby Kommune**	0 dage	on 11-03-15
9			
10	**Prækvalifikation Totalrådgivere til forslagsfasen**	**66 dage**	**on 11-02-15**
11	Udarbejdelse af bekendtgørelse	20 dage	on 11-02-15
12	Endelig bekendtgørelse	3 dage	on 11-03-15
13	Afsendelse af bekendtgørelse	0 dage	fr 13-03-15
14	Anmodningsfrist (min. 30 dage)	22 dage	ma 16-03-15
15	Modtagelse af anmodninger	0 dage	ti 14-04-15
16	Vurdering af anmodninger	14 dage	on 15-04-15
17	Vurderingsmøde	0 dage	ma 04-05-15
18	Valg af tilbudsgivere og meddelsesbreve	5 dage	ti 05-05-15
19	**Meddelelse til Styregruppen**	2 dage	ti 12-05-15
20	Samtidig meddelelse om prækvalifikation	0 dage	on 13-05-15
21			
22	**UdbudsmaterialeTotalrådgivere til forslagsfasen**	**45 dage**	**ma 16-03-15**
23	Udbuds- og konkurrencebetingelser	25 dage	ma 16-03-15
24	Ydelsesbeskrivelse/afkrydsningsskema	25 dage	ma 16-03-15
25	Tilbudsliste	25 dage	ma 16-03-15
26	Aftale om totalrådgivning	25 dage	ma 16-03-15
27	Planlægningsmøde	0 dage	fr 17-04-15
28	Samlet udbudsmateriale	20 dage	ma 20-04-15
29			
30	**Konkurrencefasen Totalrådgiver til forslagsfasen**	**62 dage**	**on 13-05-15**
31	Budopfordring	0 dage	on 13-05-15
32	Tilbudsperiode (min 35 dage)	26 dage	to 14-05-15
33	Besigtigelse	0 dage	ti 02-06-15
34	Modtagelse af tilbud	0 dage	to 18-06-15
35	Præsentation af tilbud	0 dage	fr 19-06-15
36	Tilbudsvurdering	10 dage	fr 19-06-15
37	Vurderingsmøde	0 dage	to 02-07-15
38	Endelig vurdering	5 dage	fr 03-07-15
39	Valg af vinder og meddelelsesbreve	6 dage	fr 10-07-15
40	**Meddelelse til Styregruppen**	2 dage	ma 20-07-15
41	Meddelelse til de bydende	0 dage	ti 21-07-15
42	Stand-still periode	8 dage	on 22-07-15
43	Indgåelse af totalrådgiveraftale	5 dage	ma 03-08-15
44			
45	**Bekendtgørelse om indgået kontrakt**	**10 dage**	**ma 10-08-15**
46	Bekendtgørelse om indgået kontrakt	10 dage	ma 10-08-15
47			
48	**Projektering Forslagsfasen**	**153 dage?**	**ma 10-08-15**
49	Dataindsamling	15 dage	ma 10-08-15
50	Forundersøgelser	40 dage	ma 31-08-15
51	Færdiggørelse af byggeprogram	20 dage	ma 10-08-15
52	Dispositionsforslag	25 dage	ma 07-09-15
53	Projektforslag	35 dage	ma 12-10-15
54	Udbuds- og konkurrencebetingelser	25 dage	ma 12-10-15
55	Særlige betingelser (SB)	25 dage	ma 12-10-15
56	Generelle bestemmelser	25 dage	ma 12-10-15
57	Tilbudsliste	25 dage	ma 12-10-15
58	Grænskning af projektforslag	7 dage	ma 30-11-15
59	Tilretning af projektforslag	8 dage	on 09-12-15
60	Endeligt projektforslag	0 dage	fr 18-12-15
61	**Meddelelse til Følgegruppen**	1 dag?	ma 04-01-16
62	**Godkendelse af projektforslag i Styregruppen**	8 dage	ma 04-01-16
63	Projektforslag og anlægsbevilling til politisk behan	0 dage	on 13-01-16
64	**Godkendelse KFU, Rødovre Kommune**	0 dage	ti 09-02-16
65	**Godkendelse ØU, Rødovre Kommune**	0 dage	on 17-02-16
66	**Godkendelse KB, Rødovre Kommune**	0 dage	ti 23-02-16
67	**Godkendelse KU, Brøndby kommune**	0 dage	on 17-02-16
68	**Godkendelse ØU, Brøndby Kommune**	0 dage	to 03-03-16
69	**Godkendelse KB, Brøddby Kommune**	0 dage	to 10-03-16
70			
71	**Prækvalifikation af totalentreprenører**	**55 dage**	**ma 14-09-15**
72	Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse	10 dage	ma 14-09-15
73	Offentliggørelse af bekendtgørelse	0 dage	fr 25-09-15
74	Anmodningsfrist	30 dage	ma 28-09-15
75	Modtagelse af anmodninger	0 dage	fr 06-11-15
76	Vurdering af anmodninger	10 dage	ma 09-11-15
77	Vurderingsmøde	0 dage	fr 20-11-15
78	Indstilling af tilbudsgivere og meddelelsesbreve	5 dage	ma 23-11-15
79	Meddelelse om prækvalifikation	0 dage	fr 27-11-15
80			
81	**Totalentrepriseudbud**	**85 dage**	**ma 14-03-16**
82	Budopfordring	0 dage	ma 14-03-16
83	Tilbudsperiode	45 dage	ma 14-03-16
84	Besigtigelse	0 dage	ti 05-04-16
85	Licitation	0 dage	fr 13-05-16
86	Præsentation af projekter	0 dage	ma 16-05-16
87	Tilbudsbedømmelse	15 dage	ma 16-05-16
88	Vurderingsmøde	0 dage	fr 03-06-16
89	Valg af totalentreprenør og meddelelsesbreve	10 dage	ma 06-06-16
90	**Meddelelse til Styregruppen**	2 dage	ma 20-06-16
91	Meddelelse til de bydende	0 dage	ti 21-06-16
92	Stand-still periode	8 dage	on 22-06-16
93	Indgåelse af Entreprisekontrakt	5 dage	ma 04-07-16
94			
95	**Bekendtgørelse om indgået kontrakt**	**10 dage**	**ma 11-07-16**
96	Bekendtgørelse om indgået kontrakt	10 dage	ma 11-07-16
97			
98	**Færdigprojektering og udførelse**	**450 dage**	**ma 11-07-16**
99	Forprojekt/myndighedsprojekt	30 dage	ma 11-07-16
100	Myndighedsbehandling	60 dage	ma 22-08-16
101	Byggetilladelse	0 dage	fr 11-11-16
102	Hovedprojekt	75 dage	ma 22-08-16
103	Mobilisering	15 dage	ma 14-11-16
104	Udførelse	300 dage	ma 05-12-16
105	Mangelgennemgang og udbedring	15 dage	ma 29-01-18
106	Aflevering	0 dage	fr 16-02-18
107	Idriftsættelse	30 dage	ma 19-02-18
108			
109	**Ibrugtagning**	**0 dage**	**fr 30-03-18**
110	Ibrugtagning	0 dage	fr 30-03-18

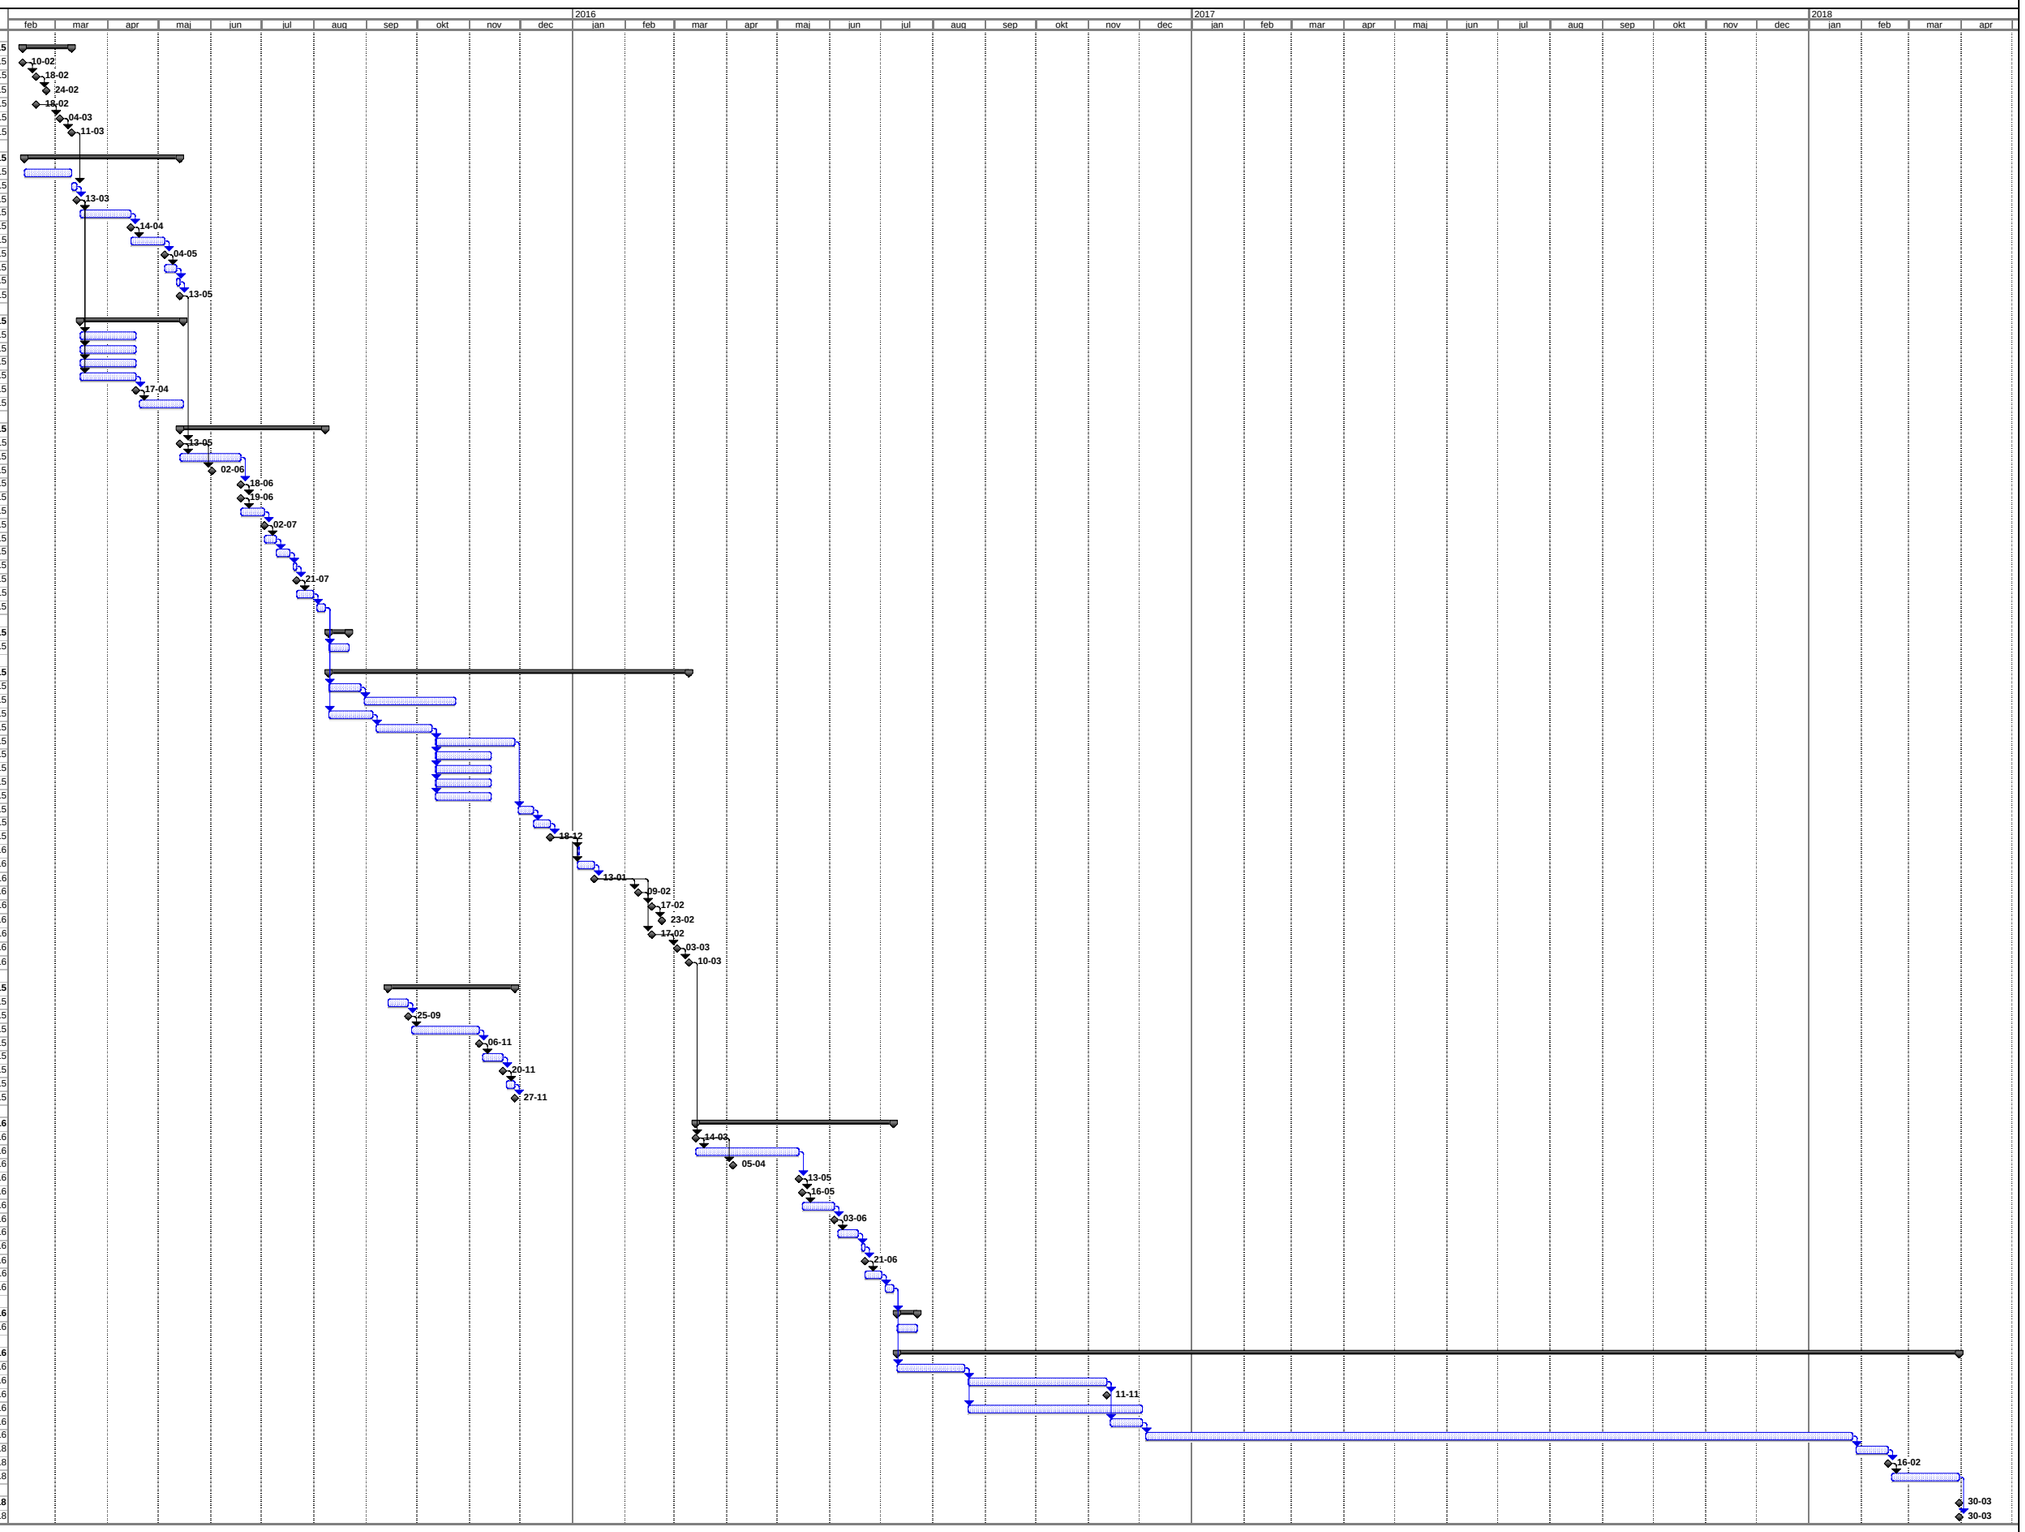

Lilholm & Partnere
